

ACIRV MEET

Changelog consolidado de evolução do projeto

Comparação entre a ideia inicial, o planejamento do MVP, o histórico de prompts/iterações e o código atual do SaaS.

Data	04/04/2026
Base analítica	PDF do MVP + histórico do ChatGPT + histórico do Lovable + código atual do zip
Objetivo	Registrar o que foi implementado, ajustado e melhorado, sempre comparando com a versão anterior e com

Leitura rápida: o projeto saiu do estado **ideia** para um SaaS com **fluxo completo, backend em Supabase, RLS, modelo custom de agenda, hooks com React Query, lazy loading e 39 testes** declarados/identificados no snapshot atual.

1. Escopo e método

Este relatório consolida a evolução do ACIRV MEET desde a fase de ideia até o código atual do SaaS.

A leitura combina quatro camadas: planejamento do MVP, histórico de prompts/decisões no ChatGPT, histórico de execução no Lovable e inspeção direta da estrutura do código atual.

Quando um item aparece no histórico do Lovable e também é confirmado no snapshot atual do repositório, ele foi tratado como implementado. As curvas de maturidade dos gráficos são analíticas e servem para visualizar a progressão do projeto.

Fontes consideradas

- MVP SaaS - ACIRV MEET.pdf (problema, escopo, entidades, fluxos, telas e regras do produto).
- Histórico do ChatGPT - ACIRV Meet - 0404260330.md (racional, prompts e decisões de arquitetura).
- Histórico do Chat Lovable - ACIRV Meet - 0404260330.md / lovable-chat exports (execução, respostas do Lovable e sequência de ajustes).
- Zip atual do código (snapshot real de arquivos, páginas, hooks, migrations, testes e módulos).

2. Síntese executiva

- Do ponto de partida conceitual até o código atual, o projeto evoluiu em camadas: estrutura inicial, estabilização do fluxo público, redesign do core da agenda, refatoração técnica, QA e hardening final do domínio.
- No snapshot atual, o código expõe 9 rotas/páginas principais, 8 hooks dedicados, 5 migrations Supabase, 5 arquivos de teste e 39 casos de teste identificados.
- A maior evolução qualitativa foi a passagem de uma agenda baseada apenas em janela genérica para um modelo com `meeting_slots`, fallback legado e coerência mais forte entre duração real, disponibilidade e horário final confirmado.

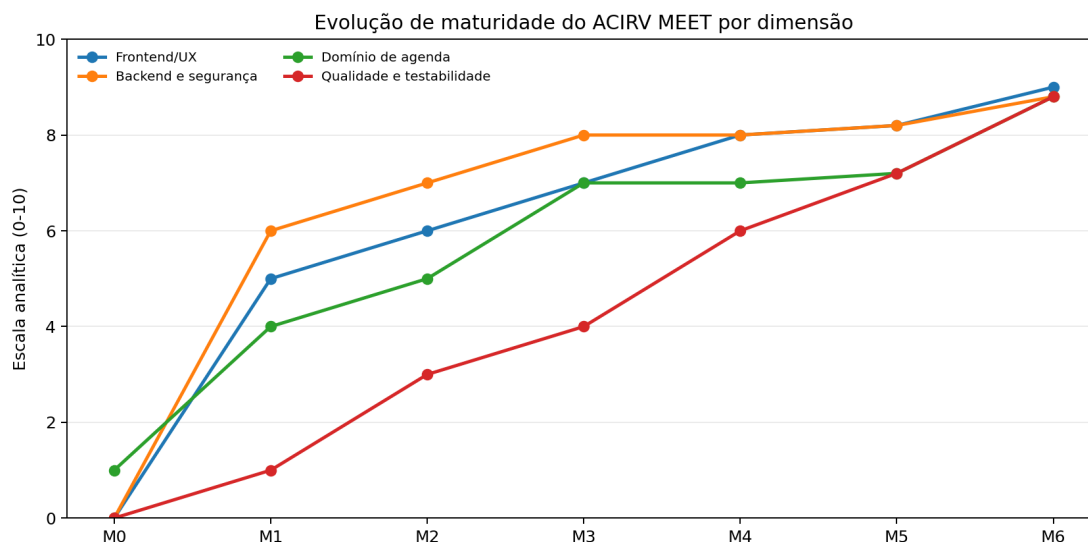


Figura 1 - Evolução analítica de maturidade por dimensão. A escala é interpretativa e resume o avanço relativo do projeto em frontend/UX, backend/segurança, domínio de agenda e qualidade/testabilidade.

3. Linha do tempo e changelog por marco

v0.0 - Ideia validada

Quando: Ideação / PDF

Nível de evolução: Conceitual

Em relação à versão anterior: Ponto zero: não havia código, apenas problema, público, fluxo e regras do MVP.

- Definição do problema: conciliar agendas sem troca interminável de mensagens.
- Definição do diferencial: convite por link + fricção zero para o participante.
- Escopo do MVP delimitado: auth do organizador, coleta de disponibilidade, cruzamento, confirmação final e ICS.

Rotas	0	Hooks	0
Migrations	0	Casos de teste	0

v0.1 - MVP base implementado

Quando: Primeira entrega do Lovable

Nível de evolução: Estrutural

Em relação à versão anterior: Saiu do zero e virou um SaaS navegável com backend, auth, rotas principais e fluxo organizador/participante.

- Criação da base Supabase com profiles, meetings, participants e availabilities.
- RLS inicial, trigger de profile no cadastro e RPCs públicas para o participante.
- Landing, auth, dashboard, nova reunião, painel, convite, grade de disponibilidade e tela de sucesso.
- Primeira versão do design system e do fluxo mobile-first do participante.

Rotas	8	Hooks	0
Migrations	1	Casos de teste	0

v0.2 - Estabilização do fluxo público

Quando: Rodada de bugfixes

Nível de evolução: Funcional

Em relação à versão anterior: O foco saiu de 'existir' para 'funcionar melhor', com reentrada, sessão e contagem real de respostas.

- Nova RPC get_participant_availabilities para recarregar slots já salvos.
- Nova RPC count_meeting_respondents para contar somente participantes que realmente responderam.
- Reentrada do participante no mesmo navegador e limpeza de sessão inválida.
- Dashboard e MeetingPanel passaram a diferenciar participante pendente de respondente real.

Rotas	8	Hooks	0
Migrations	2	Casos de teste	0

v0.3 - Modelo custom de agenda

Quando: Redesign do core

Nível de evolução: Produto

Em relação à versão anterior: A reunião deixou de depender só de janela genérica e passou a aceitar slots

definidos pelo organizador.

- Criação da tabela `meeting_slots` e do campo `slot_mode` em `meetings`.
- RPC pública `get_meeting_slots` e atualização de `get_public_meeting`.
- `NewMeeting` virou fluxo em 3 etapas: info, calendário e seleção de horários por dia.
- Compatibilidade e `InviteAvailability` passaram a entender modo `legacy (window)` e modo `custom`.

Rotas	8	Hooks	0
Migrations	5	Casos de teste	0

v0.4 - Refatoração e performance

Quando: Rodada técnica

Nível de evolução: Técnico

Em relação à versão anterior: O projeto ganhou organização interna, query layer e carregamento sob demanda.

- Lazy loading de todas as rotas com `Suspense`.
- Adoção real de `TanStack Query` para dados públicos, dashboard, painel e sessão do participante.
- Criação de tipos compartilhados e hooks dedicados: `usePublicMeeting`, `useParticipantSession`, `useDashboardMeetings`, `useMeetingPanel` e outros.
- Remoção de código legado não usado, como `App.css` e `NavLink`.

Rotas	9	Hooks	6
Migrations	5	Casos de teste	0

v0.5 - QA e cobertura inicial

Quando: Rodada de limpeza/QA

Nível de evolução: Qualidade

Em relação à versão anterior: O projeto passou a ter cobertura automatizada dos blocos mais sensíveis e limpeza de código morto.

- 22 testes adicionados cobrindo slots, ICS, sessão do participante e `availabilities`.
- Melhorias de microcopy e limpeza de imports/funções não usadas.
- Fluxos de `loading`, `empty`, `error` e `success` revisados no histórico.

Rotas	9	Hooks	6
Migrations	5	Casos de teste	22

v0.6 - Hardening final do domínio

Quando: Rodada de correção fina

Nível de evolução: Domínio + UX

Em relação à versão anterior: A agenda ficou mais coerente com a duração real da reunião e a etapa 3 saiu do modelo artificial.

- Correção da RPC `create_participant_for_meeting`: referência ambígua a `edit_token` resolvida via migration.
- Duração da reunião passou a aceitar apenas inteiros em horas.
- Etapa 3 ganhou 'dia inteiro' real (00:00–23:59), validação de sobreposição e deduplicação de slots.
- `confirmSlot` em `MeetingPanel` passou a usar `duration_minutes` sempre, corrigindo o fechamento final.

- Lógica de slots foi extraída para meeting-slots.ts e a UI da etapa 3 para DayCard.tsx.
- Cobertura automatizada subiu para 39 testes.

Rotas	9	Hooks	8
Migrations	5	Casos de teste	39

4. Evolução quantitativa

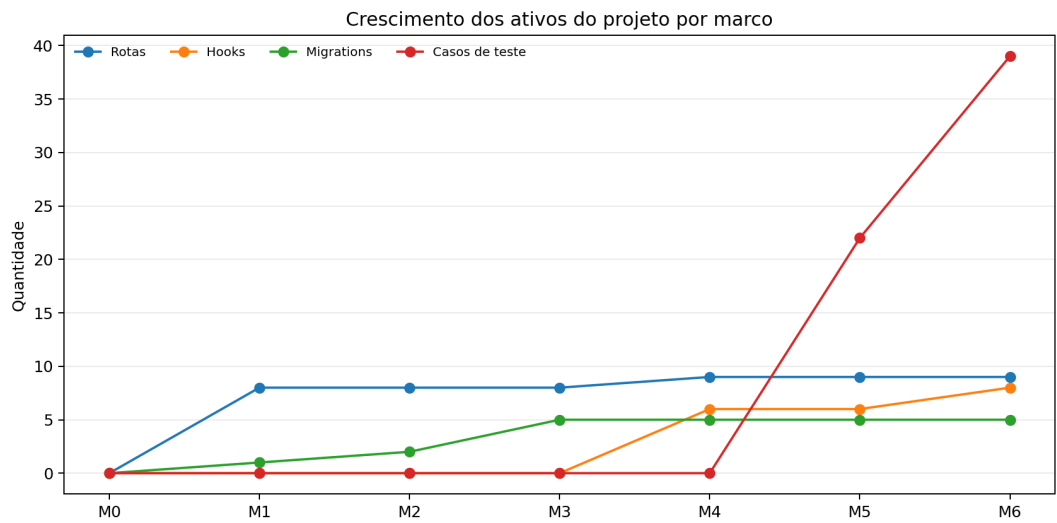


Figura 2 - Crescimento dos ativos do projeto por marco. O gráfico mostra o ganho progressivo de rotas, hooks, migrations e casos de teste ao longo das iterações.

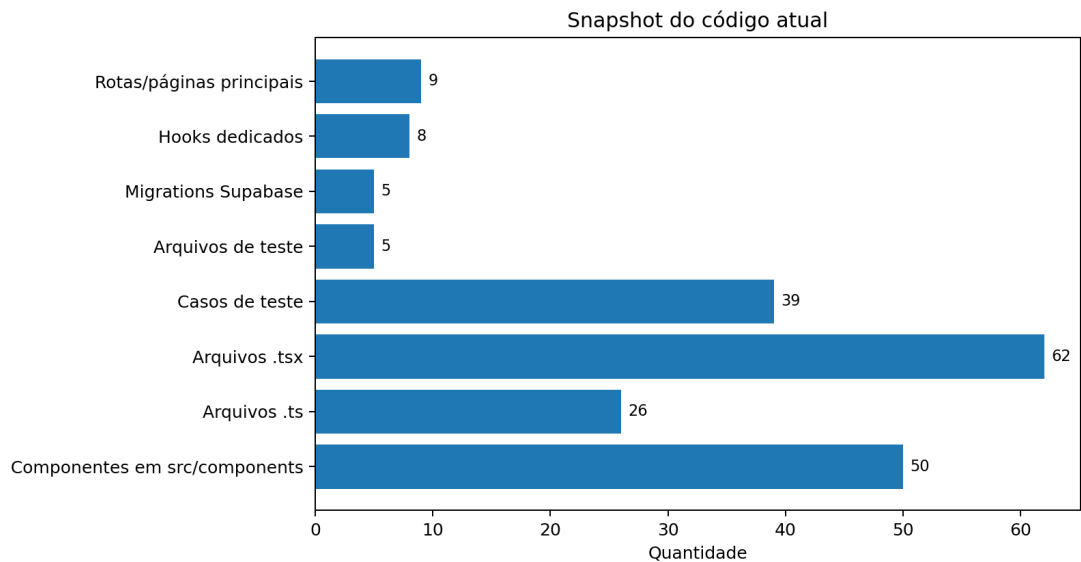


Figura 3 - Snapshot do código atual extraído do zip mais recente.

Snapshot técnico atual

Rotas/páginas principais	9
Hooks dedicados	8
Migrations Supabase	5
Arquivos de teste	5
Casos de teste	39
Arquivos .tsx	62
Arquivos .ts	26

Componentes em src/components	50
-------------------------------	----

5. Comparação direta: ideia inicial vs versão atual

Dimensão	Ponto de partida	Estado atual observado
Problema	Conciliação manual de agenda por mensagens.	Fluxo web completo para criação, compartilhamento, resposta e feedback.
Papéis	Organizador e convidado definidos conceitualmente.	Separação real entre área autenticada do organizador e fluxo sem login.
Disponibilidade	Grade de horários prevista no MVP.	Modo legado por janela + modo custom com meeting_slots e faixas de horário.
Segurança	Necessidade implícita de proteger dados.	RLS, trigger de profile, RPCs públicas controladas e autenticação via JWT.
Evolução técnica	Nenhum código.	9 páginas, 8 hooks, 5 migrations, 39 testes, 50 componentes e 4 bibliotecas.

Principais ganhos por dimensão

Produto e fluxo

- Ideia inicial transformada em jornada completa de organizador e participante.
- Criação de reunião evoluiu de janela genérica para seleção direta de dias e faixas.
- Fluxo de reentrada do participante e carregamento de disponibilidade foram introduzidos.
- Compatibilidade passou a operar em modo legado e modo customizado.

Backend e segurança

- Auth do organizador consolidado com profiles ligados a auth.users.
- RLS aplicado às tabelas centrais.
- RPCs públicas criadas para fluxo sem login do participante.
- Nova tabela meeting_slots adicionada para o modelo custom.
- RPC create_participant_for_meeting corrigida após ambiguidade em edit_token.

Arquitetura do frontend

- Rotas migradas para lazy loading com Suspense.
- Adoção de TanStack Query em dashboard, painel e fluxos públicos.
- Sessão do participante centralizada em hook dedicado.
- Extração de lógica de slots para módulo separado e UI diária para DayCard.

Qualidade e testes

- Contagem real de respondentes introduzida.
- Cobertura inicial de 22 testes adicionada.
- Cobertura ampliada para 39 testes com foco em slots, sessão e ICS.
- Validações de sobreposição, deduplicação e all-day adicionadas.

6. Código Python incluído

O pacote final inclui um script Python que gera os gráficos usados neste relatório. Ele foi construído para ser fácil de ajustar caso você queira alterar os marcos, scores analíticos ou métricas do projeto.

Arquivo entregue: **acirv_meet_evolution_charts.py**

```
from pathlib import Path
import matplotlib.pyplot as plt

MILESTONES = [
    {
        "id": "M0",
        "version": "v0.0",
        "title": "Ideia validada",
        "when": "Ideação / PDF",
        "level": "Conceitual",
        "vs_previous": "Ponto zero: não havia código, apenas problema, público, fluxo e regras do MVP.",
        "changes": [
            "Definição do problema: conciliar agendas sem troca interminável de mensagens.",
            "Definição do diferencial: convite por link + fricção zero para o participante.",
            "Escopo do MVP delimitado: auth do organizador, coleta de disponibilidade, cruzamento, confirmação final e ICS."
        ],
        "metrics": {
            "routes": 0,
            "hooks": 0,
            "migrations": 0,
            "tests": 0
        }
    },
    {
        "id": "M1",
        "version": "v0.1",
        "title": "MVP base implementado",
        "when": "Primeira entrega do Lovable",
        "level": "Estrutural",
        "vs_previous": "Saiu do zero e virou um SaaS navegável com backend, auth, rotas principais e fluxo organizador/participante.",
        "changes": [
            "Criação da base Supabase com profiles, meetings, participants e availabilities.",
            "RLS inicial, trigger de profile no cadastro e RPCs públicas para o participante.",
            "Landing, auth, dashboard, nova reunião, painel, convite, grade de disponibilidade e tela de sucesso.",
            "Primeira versão do design system e do fluxo mobile-first do participante."
        ],
        "metrics": {
            "routes": 8,
            "hooks": 0,
            "migrations": 1,
            "tests": 0
        }
    },
    {
        "id": "M2",
        "version": "v0.2",
        "title": "Estabilização do fluxo público",
        "when": "Rodada de bugfixes",
    }
```

O script gera três imagens: maturidade por dimensão, crescimento dos ativos do projeto e snapshot do código atual.

7. Conclusão

Em comparação com o ponto de partida, o ACIRV MEET deixou de ser uma ideia de conciliação de agenda para se tornar um SaaS com produto, backend, frontend, segurança, refatoração, testes e hardening de domínio.

O salto principal não foi apenas a quantidade de código. O avanço mais relevante foi a evolução em camadas: primeiro estrutura, depois estabilidade, depois modelo custom, depois arquitetura, depois QA e por fim coerência fina da agenda.

Como material de gestão, este changelog serve tanto para registrar o progresso já realizado quanto para mostrar, de forma visual, como o projeto amadureceu ao longo das iterações.

Referências usadas nesta consolidação

- Planejamento: MVP SaaS - ACIRV MEET.pdf
- Histórico de decisão: Histórico do ChatGPT - ACIRV Meet - 0404260330.md
- Histórico de execução: Histórico do Chat Lovable - ACIRV Meet - 0404260330.md / lovable-chat exports
- Snapshot técnico: zip atual do código do SaaS
